
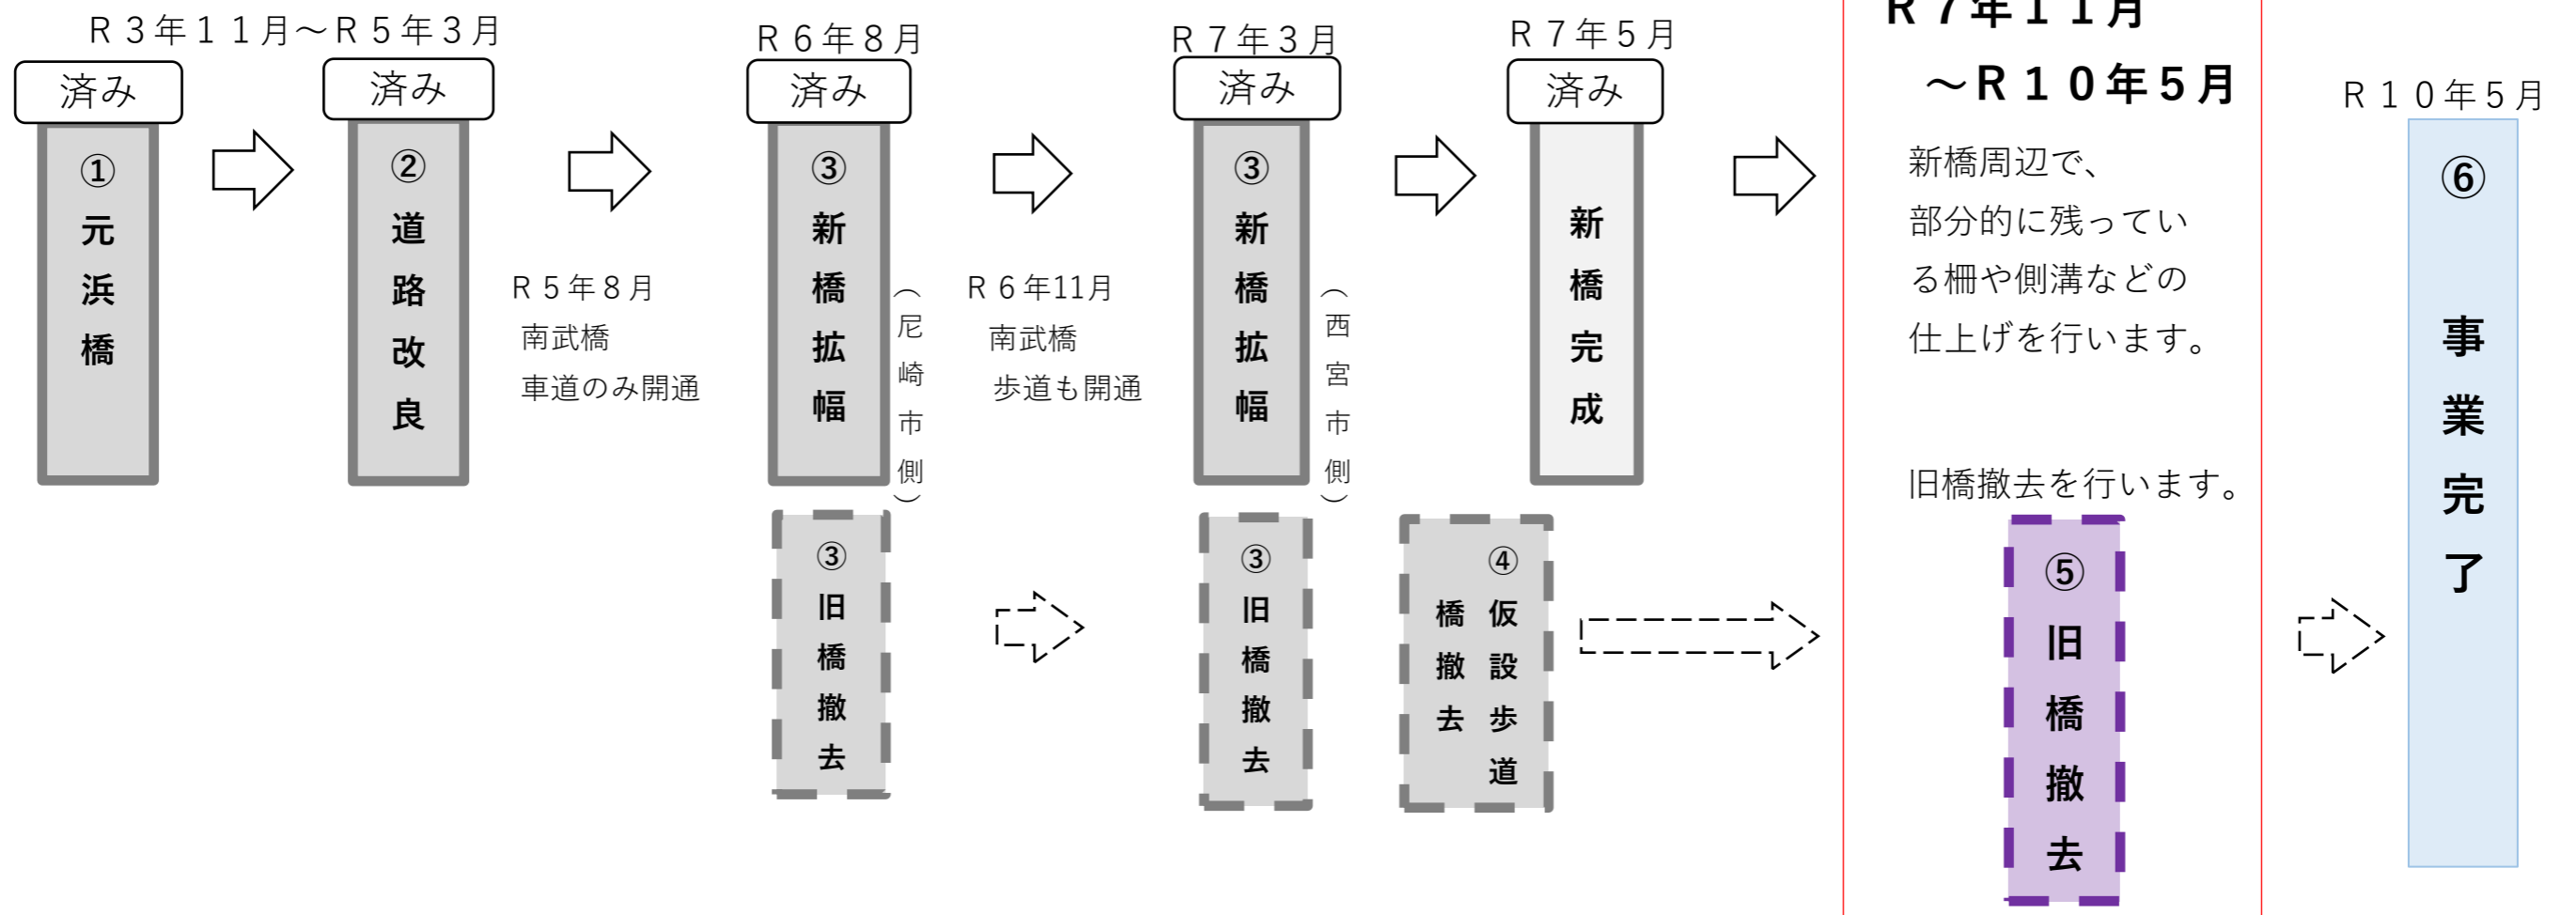


武庫川水系武庫川 南武橋架替事業の流れ

R 8年6月30日時点

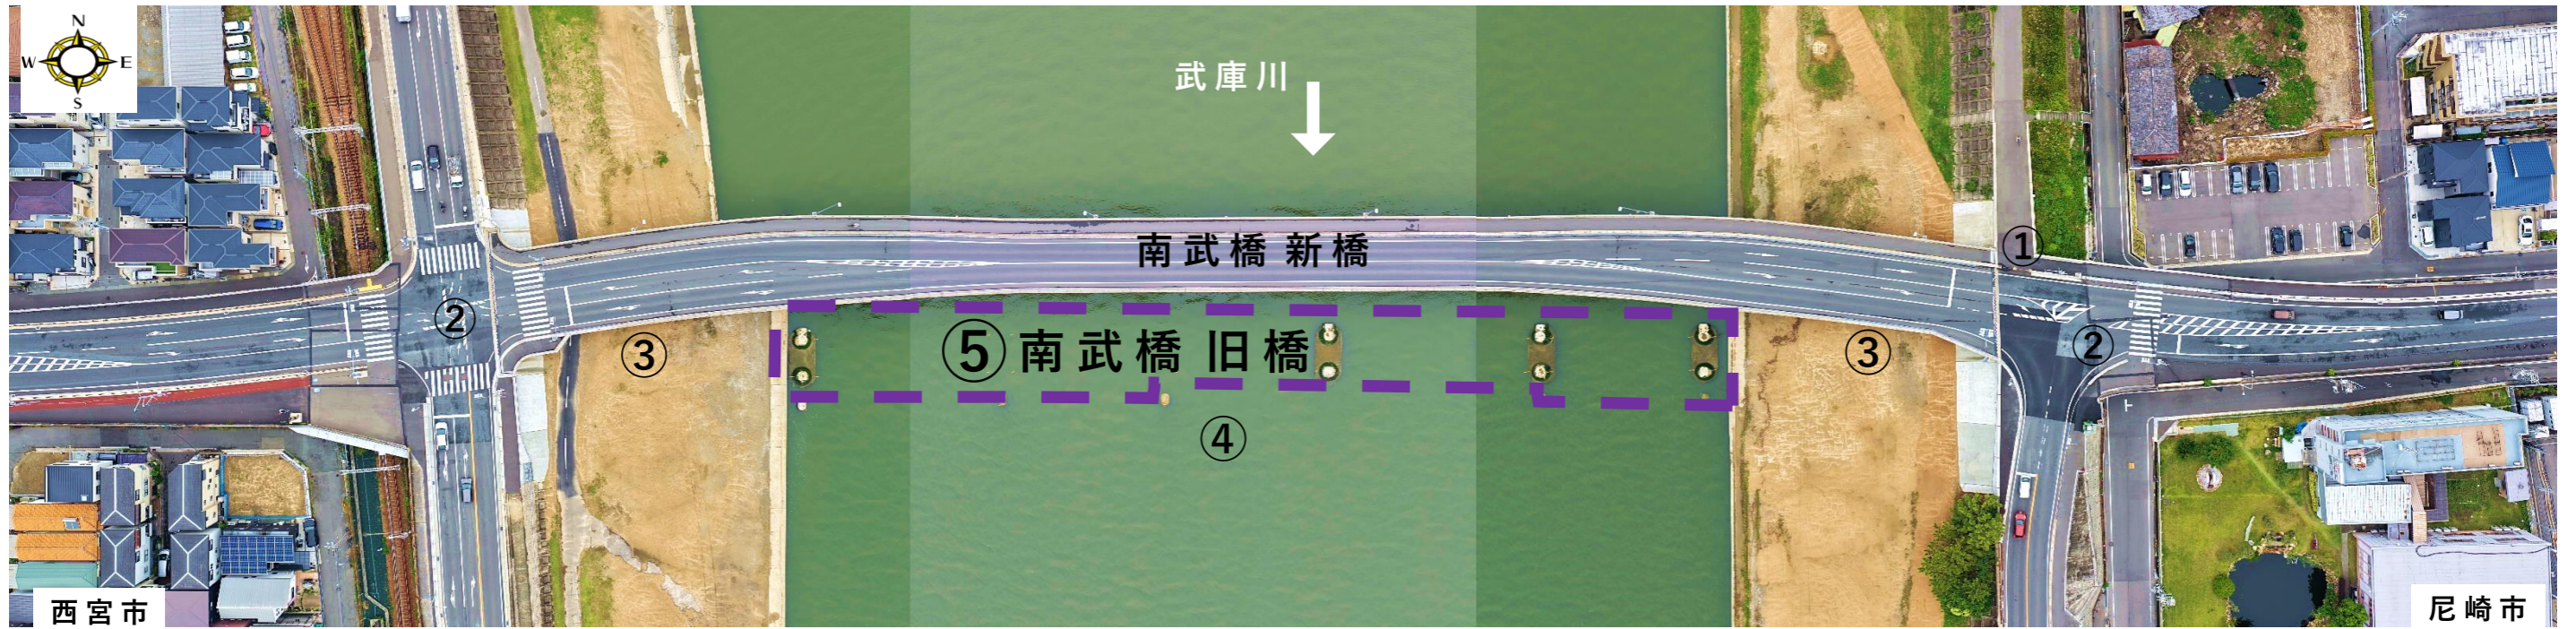


工事の流れ

凡例

↔ : 車両通行
 ↔ : 歩行者通行


① 元浜橋拡幅

済み

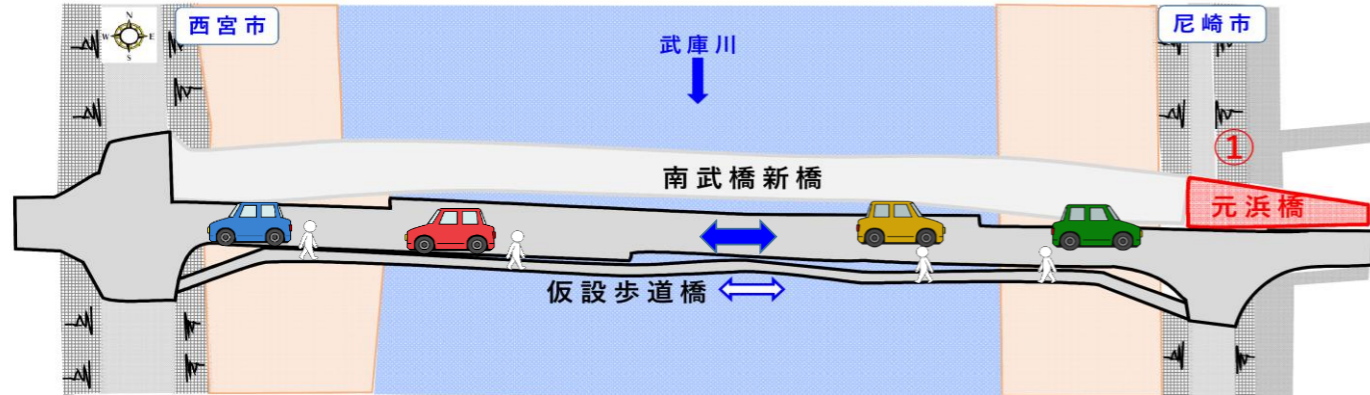


② 交通切替道路改良（車両は新橋へ交通切替え）

済み

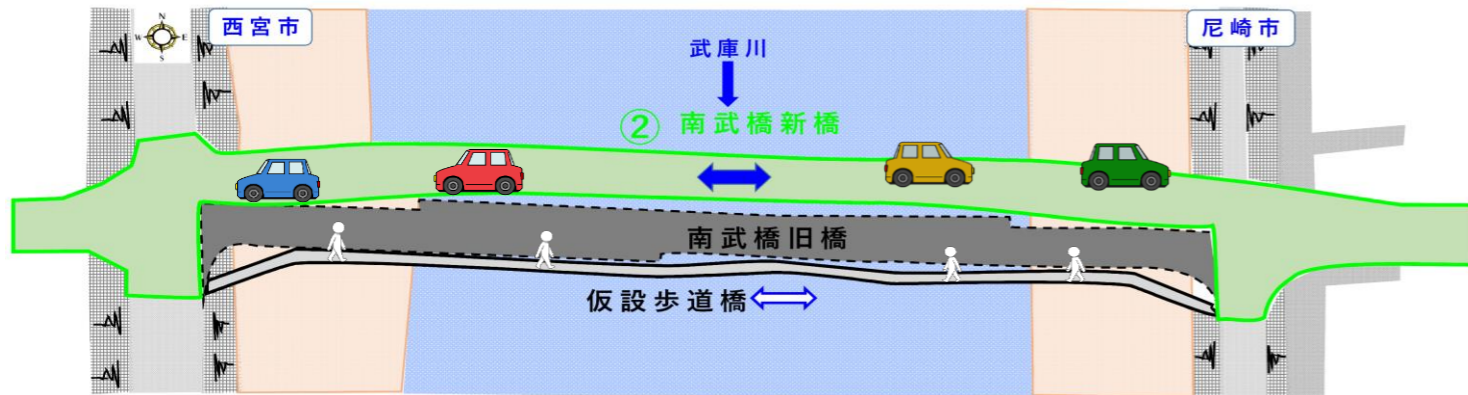


③ 南武橋新橋拡幅・既設橋一部撤去（新橋バチ部の拡幅）

済み

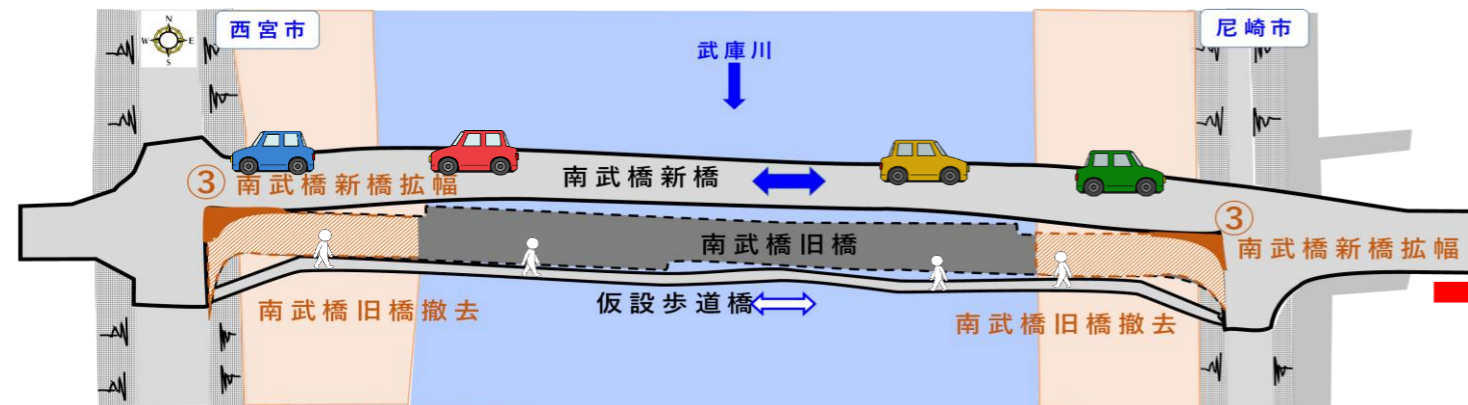


④ 仮設歩道橋撤去

済み

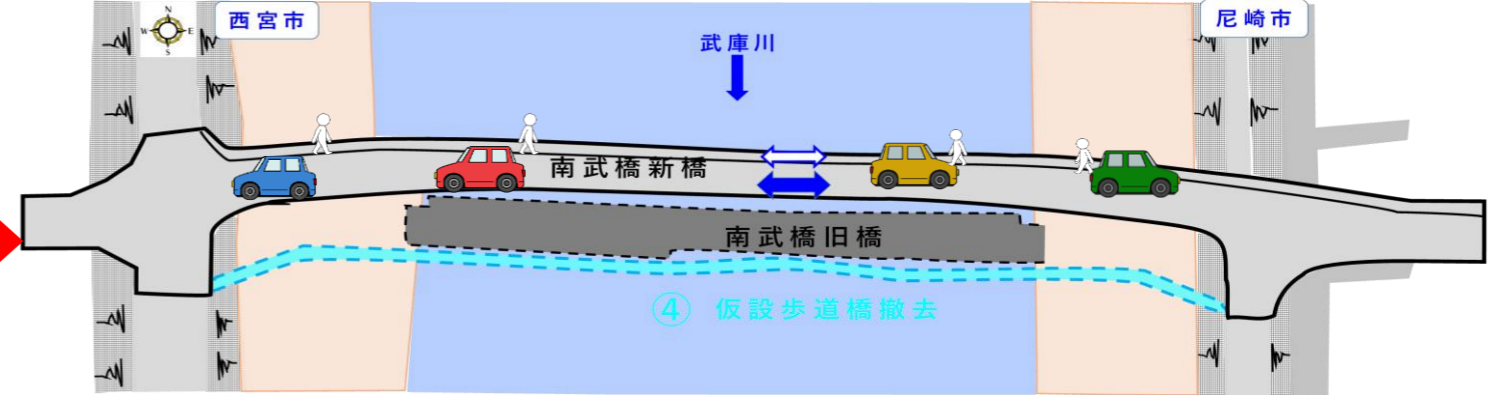

⑤ 南武橋旧橋撤去

R7.11~工事予定

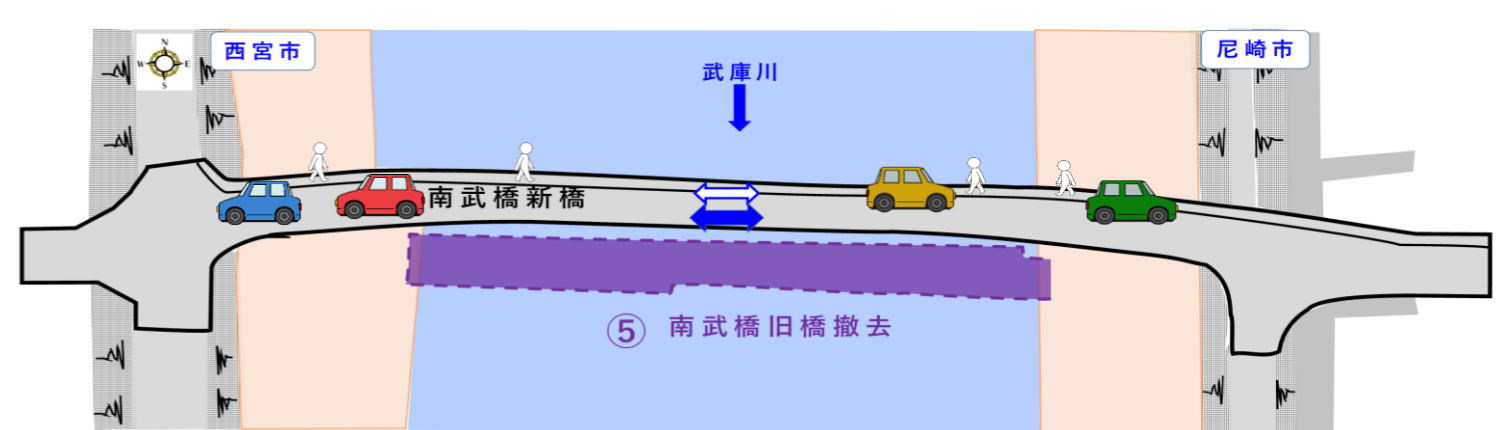

⑥ 南武橋事業完了

