

浜坂道路Ⅱ期事業の
取組み状況をお知らせします。

各地区の工事進捗状況についてお知らせいたします。橋梁等を各工区で工事中です。引き続きご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。


釜屋地区

新釜屋トンネルの掘削を9月上旬から開始しました。竿谷から釜屋（東から西）に向かって掘削し、延長180mのトンネルを建設予定です。浜坂道路Ⅱ期で最初に貫通するトンネルであり、順調に工事が進めば冬頃の貫通予定です。



諸寄地区

JRを高架する橋梁の4基の橋脚が完成しました。また、大栃川西側の切土工事も完了し、浜坂道路の完成形がイメージできるようになってきました。秋以降は2基の橋台工事に、そして来年からはいよいよトンネル工事に本格的に着手する予定です。

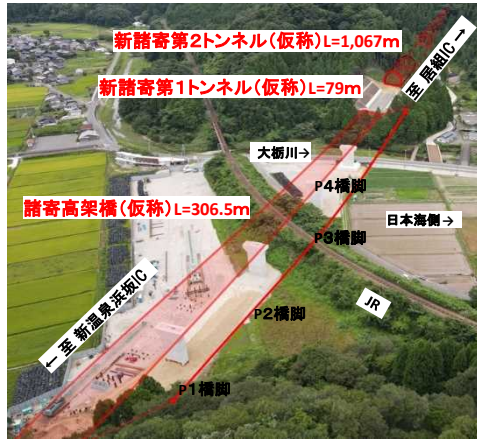


戸田地区

浜坂第2トンネル（仮称）建設工事（東工区）では、現在坑口から約660m付近まで掘削が進んでいます。8月から掘削と並行して防水工を開始しています。アーチ部にビニール製の防水シートを張り、地山からの湧水がトンネル内に漏水するのを防ぎます。



栃谷地区

BOXカルバートが完成しました。9月下旬にカルバート内を通行できるようになります。将来はBOXカルバートの上に浜坂道路Ⅱ期の本線や鳥取方面と接続するONランプとOFFランプが通るようになります。

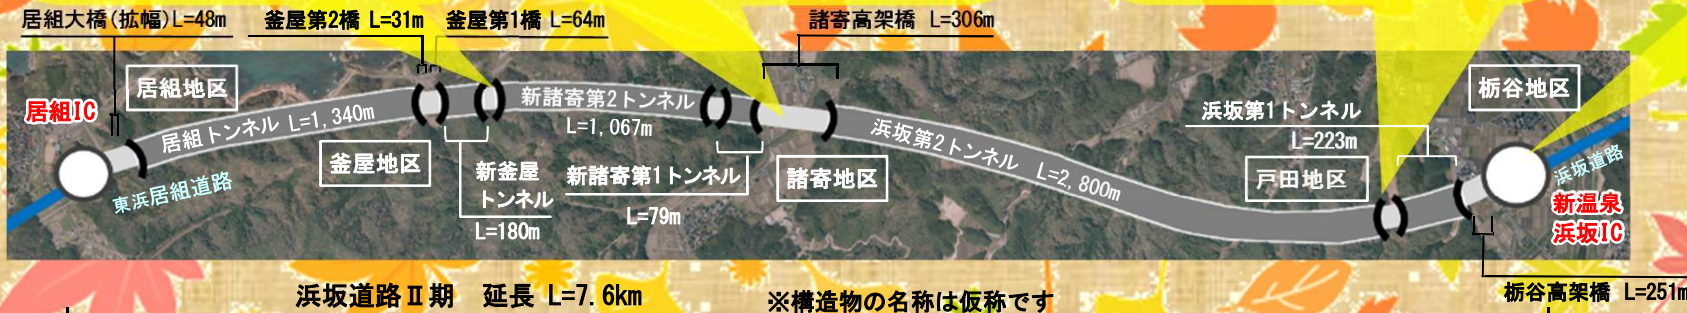

【浜坂道路フェイスブック】
浜坂道路Ⅱ期の進捗状況や新温泉土木事務所の特ピックス等を掲載していますので、ぜひご覧下さい。
<https://www.facebook.com/shinonsen>
