


# 河川事業 二級河川武庫川水系波賀野川（継続：再評価〔第1回〕）

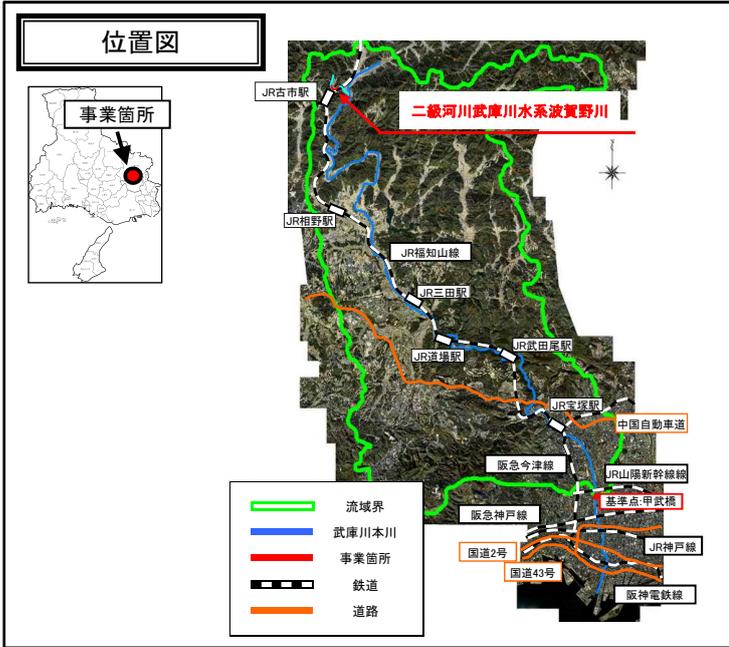

### 事業概要および進捗状況



工区	事業区間	整備内容	計画規模	今回評価時点	前回評価時点
武庫川水系 波賀野川	丹波篠山市 波賀野	整備延長440m 河道掘削 3,500m <sup>3</sup> 護岸整備 3,000m <sup>2</sup>	1/2	事業費	4.0億
				残事業費	2.5億
				進捗率	37.5%
				完了予定年度	R7
				R1	R1

武庫川水系 新規事業評価年度	平成22年度
河川整備計画策定年度	平成23年度
波賀野川 新規事業評価年度	平成26年度

河川整備計画に位置づけられた全ての事業によるB/C	12.4
---------------------------	------

### 事業の目的、必要性・優先性

目的	①当箇所は、度々浸水被害が生じており、近年では、昭和58年、平成8年、16年、25年にも床上・床下の浸水被害(4回で延べ30戸)が発生している。このため、戦後第2位の洪水(S36.6洪水)と同規模の計画流量25m <sup>3</sup> /sを目標として河川改修を行い、沿川の治水安全度向上を図る。
必要性 優先性	①現況流下能力は約15m <sup>3</sup> /sであり、計画流量25m <sup>3</sup> /sの6割程度しかなく、なおかつ集落内で屈曲しており、治水安全度が低い。

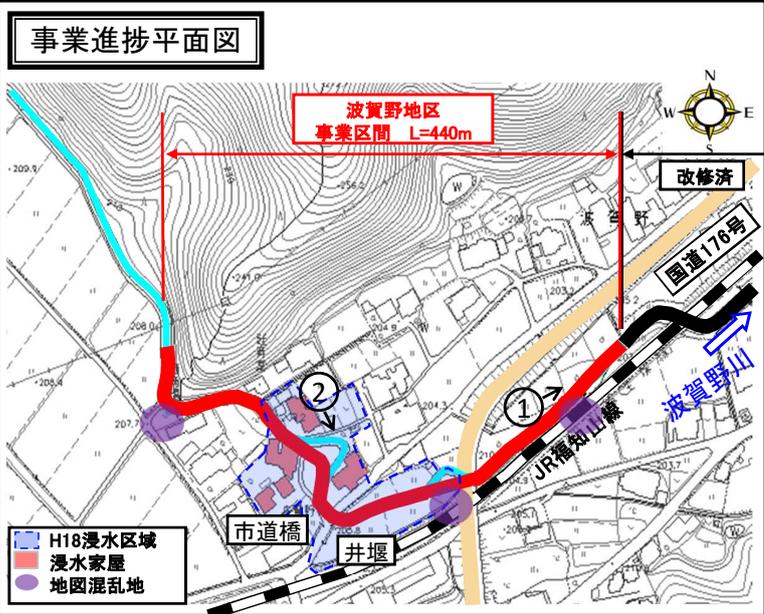

### 現況写真



### 工程表

■ : 前回計画  
■ : 実施・計画

整備内容	前期						後期														
	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	
調査設計																					
用地補償																					
築堤・護岸																					
取水施設復旧																					
橋梁架替																					

### 進捗状況

	事業進捗状況・予定	整備効果
河川整備計画全体	H27～R7 【事業費＝4.0億円】 ・整備延長 440m ・整備概要: 河床掘削、護岸	流下能力の向上 (戦後第2位の洪水である昭和36年6月27日洪水を安全に流下)
整備計画策定～再評価まで	H27～R2 【事業費＝1.5億円】 ・整備延長 100m(用地完了) ・整備概要: 河床掘削、護岸	流下能力の向上
今後予定	R3～R7 【事業費＝2.5億円】 ・整備延長 340m ・整備概要: 河床掘削、護岸	流下能力の向上 (戦後第2位の洪水である昭和36年6月27日洪水を安全に流下)

### 再評価の経緯・結果

再評価に至る経緯等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地図混乱地が3箇所あり、訂正に不測の日数(約4年)を要し、用地交渉に着手できず約4年遅延した。現在、対象地38筆のうち13筆を取得し、残りについても交渉中。</li> <li>・また、橋梁工事中は管理用道路に進入できず、護岸工事を同時施工できないためさらに約2年の遅延が見込まれる。</li> <li>・このことから完成予定を令和7年度に延伸する。</li> </ul>
再評価の結果	事業の必要性は事業採択時と変わらず、事業執行環境も整っていることから、継続して事業実施する必要がある。
