



浜坂道路Ⅱ期事業の
取組み状況をお知らせします。

令和2年12月24日(木) 発行
【お問合せ】兵庫県但馬県民局新温泉土木事務所
浜坂道路第1課・第2課・設備課 TEL:0796(82)5695
浜坂道路用地対策課 TEL:0796(82)5685


各地区の工事進捗状況についてお知らせいたします。本年中はご協力いただきありがとうございました。来年も何卒よろしくお願いたします。

居組地区

IC入口東側の斜面掘削が終盤に差し掛かっており、残すは斜面保護のための植生工となりました①。

IC正面の東西それぞれの山では斜面掘削に取り掛かるための準備として木の伐採を行い、順次斜面掘削を行っているところです②。

来年以降も引き続きIC入口周辺の山の斜面掘削工事を行っていく予定です。

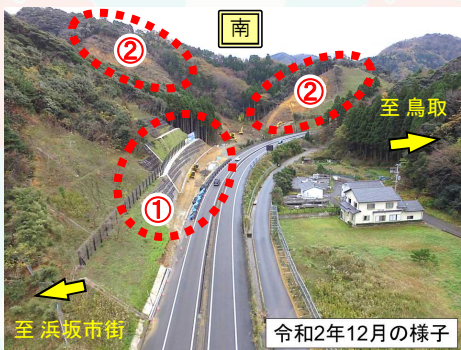

釜屋・竿谷地区

10月よりトンネル橋梁工事に向け、工事用道路を造成する工事を行っています。




諸寄地区

工事用道路となる県道拡幅工事を行っています。片側交互通行規制、仮歩道の設置等を行いながら、歩道部分の舗装作業を行っています。この工事は、令和3年2月頃の完成を予定しています。




栢谷地区

供用中のインター内で橋台工事を行っています。年度内は橋台の基礎となる杭の施工を行います③。また、国道178号西側では圃場部の造成工事に着手しました。工事用道路や圃場水路の整備等を行います。




主な構造物(トンネル、橋)の配置

浜坂道路Ⅱ期 延長 L=7.6km

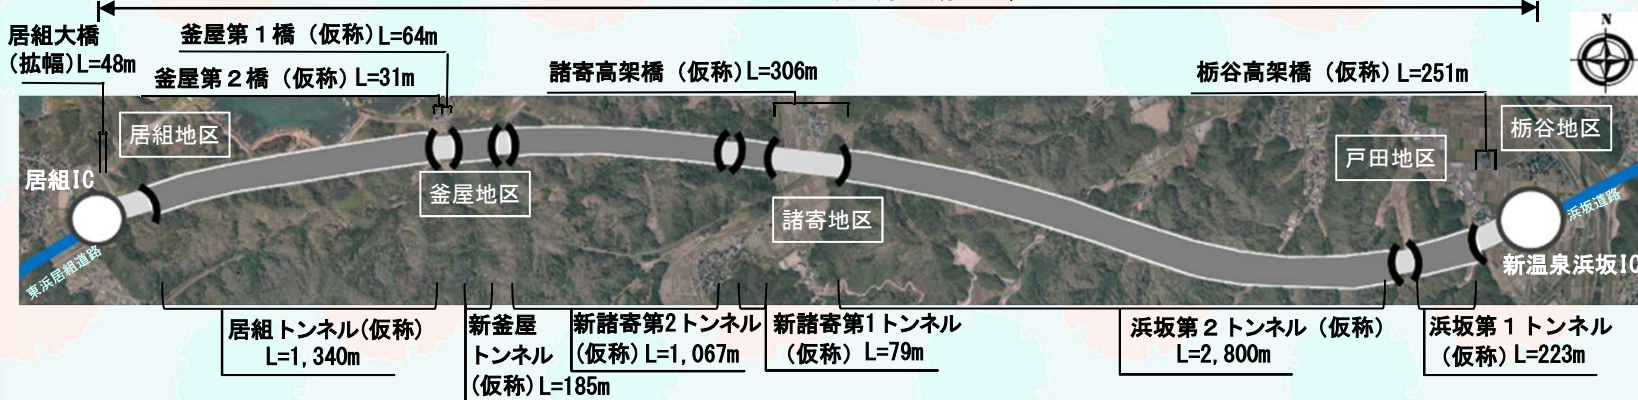

道路事業の流れ

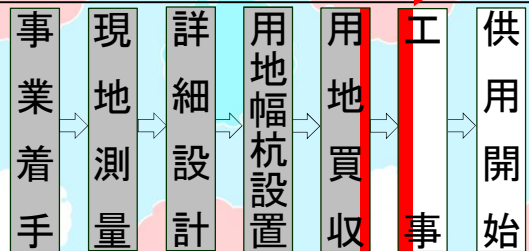

【浜坂道路フェイスブック】
浜坂道路Ⅱ期の進捗状況や
新温泉土木事務所のトピックス等を
掲載していますので、ぜひご覧下さい。

<https://www.facebook.com/shinonsen>

