


# 月別工事予定・進捗状況表

[3年 8月分]

令和 3年 9月 1日

工事名 県立〇〇高等学校〇〇棟電気設備工事	受注者 (株)〇〇電気設備
工事場所 〇〇市〇〇町〇丁目一〇	現場代理人 △川 △太
契約工期 令和3年12月25日	工事番号 営教第〇〇号
請負金額 ¥21,000,000.-	中間・ <del>出来高</del>
検査年月日 令和3年 9月 1日	立会人

工事進捗率 (%)

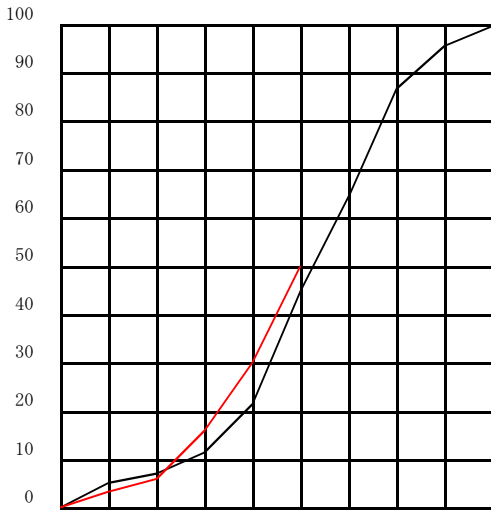

年	3
月	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
予定	0 5 7 11 21 45 65 88 95 100
実績	0 3 6 16 30 50

工 事 内 訳		
工 事 内 容	工事金額	出来高金額
1. 直接工事費		
A.	10,000,000	5,000,000
B.	5,000,000	2,500,000
C.	2,000,000	1,000,000
1. の 計	17,000,000	8,500,000
2. 共通費		
A. 共通仮設費	600,000	300,000
B. 現場経費	900,000	450,000
C. 一般管理費	1,500,000	750,000
2. の 計	3,000,000	1,500,000
合 計	20,000,000	10,000,000
消費税等相当額	2,000,000	1,000,000
総 計	22,000,000	11,000,000
<b>今回出来高</b>		<b>50%</b>

- ⑨ ・ 出来高の算出は、小科目からの積み上げによること（別紙出来高内訳書を提出）。
- ・ 設計変更契約が済んでいない場合は、変更対象工事が完了していても出来高実績には計上しないこと。
  - ・ 実績曲線は赤で記入のこと。
